





































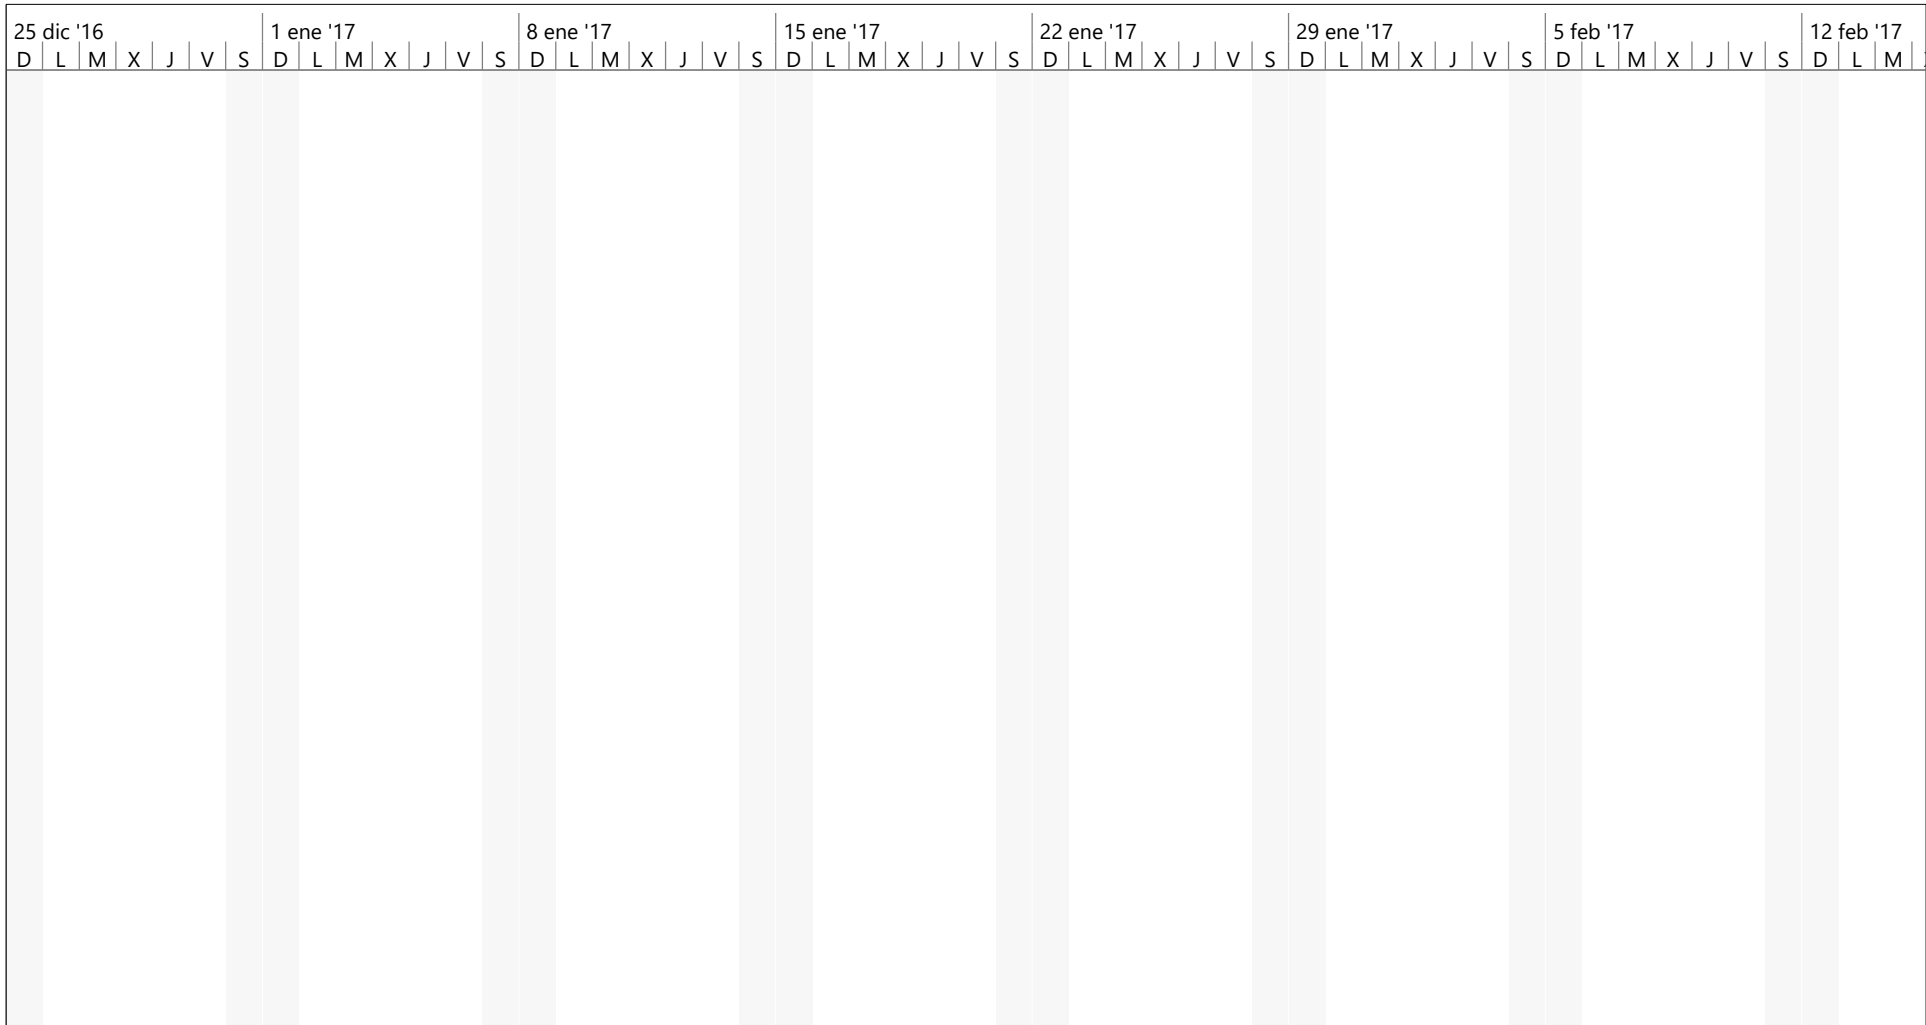
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	16							18 dic '16										
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S						
1		<b>Proyecto Fibra Villavicencio - Puerto Lopez</b>	<b>22 días</b>	<b>jue 16/03/17</b>	<b>jue 6/04/17</b>																			
2		Logística	5 días	jue 16/03/17	lun 20/03/17																			
3		<b>Tendido 1 Villavicencio</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 21/03/17</b>	<b>sáb 25/03/17</b>																			
4		Tendido Carrete Fibra 1 y 2	1 día	mar 21/03/17	mar 21/03/17	2																		
5		Tendido Carrete Fibra 3 y 4	1 día	mié 22/03/17	mié 22/03/17	4																		
6		Tendido Carrete Fibra 5 y 6	1 día	jue 23/03/17	jue 23/03/17	5																		
7		Tendido Carrete Fibra 7 y 8	1 día	vie 24/03/17	vie 24/03/17	6																		
8		Tendido Carrete Fibra 9	1 día	sáb 25/03/17	sáb 25/03/17	7																		
9		<b>Tendido 2 Puerto Lopez</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 21/03/17</b>	<b>sáb 25/03/17</b>																			
10		Tendido Carrete Fibra 1 y 2	1 día	mar 21/03/17	mar 21/03/17	2																		
11		Tendido Carrete Fibra 3 y 4	1 día	mié 22/03/17	mié 22/03/17	10																		
12		Tendido Carrete Fibra 5 y 6	1 día	jue 23/03/17	jue 23/03/17	11																		
13		Tendido Carrete Fibra 7 y 8	1 día	vie 24/03/17	vie 24/03/17	12																		
14		Tendido Carrete Fibra 9	1 día	sáb 25/03/17	sáb 25/03/17	13																		
15		<b>Empalmería</b>	<b>11 días</b>	<b>jue 23/03/17</b>	<b>dom 2/04/17</b>																			
16		Empalme 1 y 2	1 día	jue 23/03/17	jue 23/03/17	5;11																		
17		Empalme 3 y 4	1 día	vie 24/03/17	vie 24/03/17	16																		
18		Empalme 5 y 6	1 día	sáb 25/03/17	sáb 25/03/17	17																		
19		Empalme 7 y 8	1 día	dom 26/03/17	dom 26/03/17	18																		
20		Empalme 9 y 10	1 día	lun 27/03/17	lun 27/03/17	19																		
21		Empalme 11 y 12	1 día	mar 28/03/17	mar 28/03/17	20																		
22		Empalme 13 y 14	1 día	mié 29/03/17	mié 29/03/17	21																		
23		Empalme 15 y 16	1 día	jue 30/03/17	jue 30/03/17	22																		




















Proyecto: Anexo 2 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	16							18 dic '16						
								M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		
24			Empalme 17 y 18	1 día	vie 31/03/17	vie 31/03/17	23														
25			Empalme ODF Nodo 1	1 día	sáb 1/04/17	sáb 1/04/17	24														
26			Empalme ODF Nodo 2	1 día	dom 2/04/17	dom 2/04/17	25														
27			<b>Nodo</b>	<b>5 días</b>	<b>mar 21/03/17</b>	<b>sáb 25/03/17</b>															
28			Instalación Gabinete	1 día	mar 21/03/17	mar 21/03/17	2														
29			Instalación Energía	2 días	mié 22/03/17	jue 23/03/17	28														
30			Instalación Equipos de Telco	2 días	vie 24/03/17	sáb 25/03/17	29														
31			Pruebas	4 días	lun 3/04/17	jue 6/04/17	26;30;14;8														

Proyecto: Anexo 2 Cronograma  
Fecha: vie 16/12/16


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: Anexo 2 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Anexo 2 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

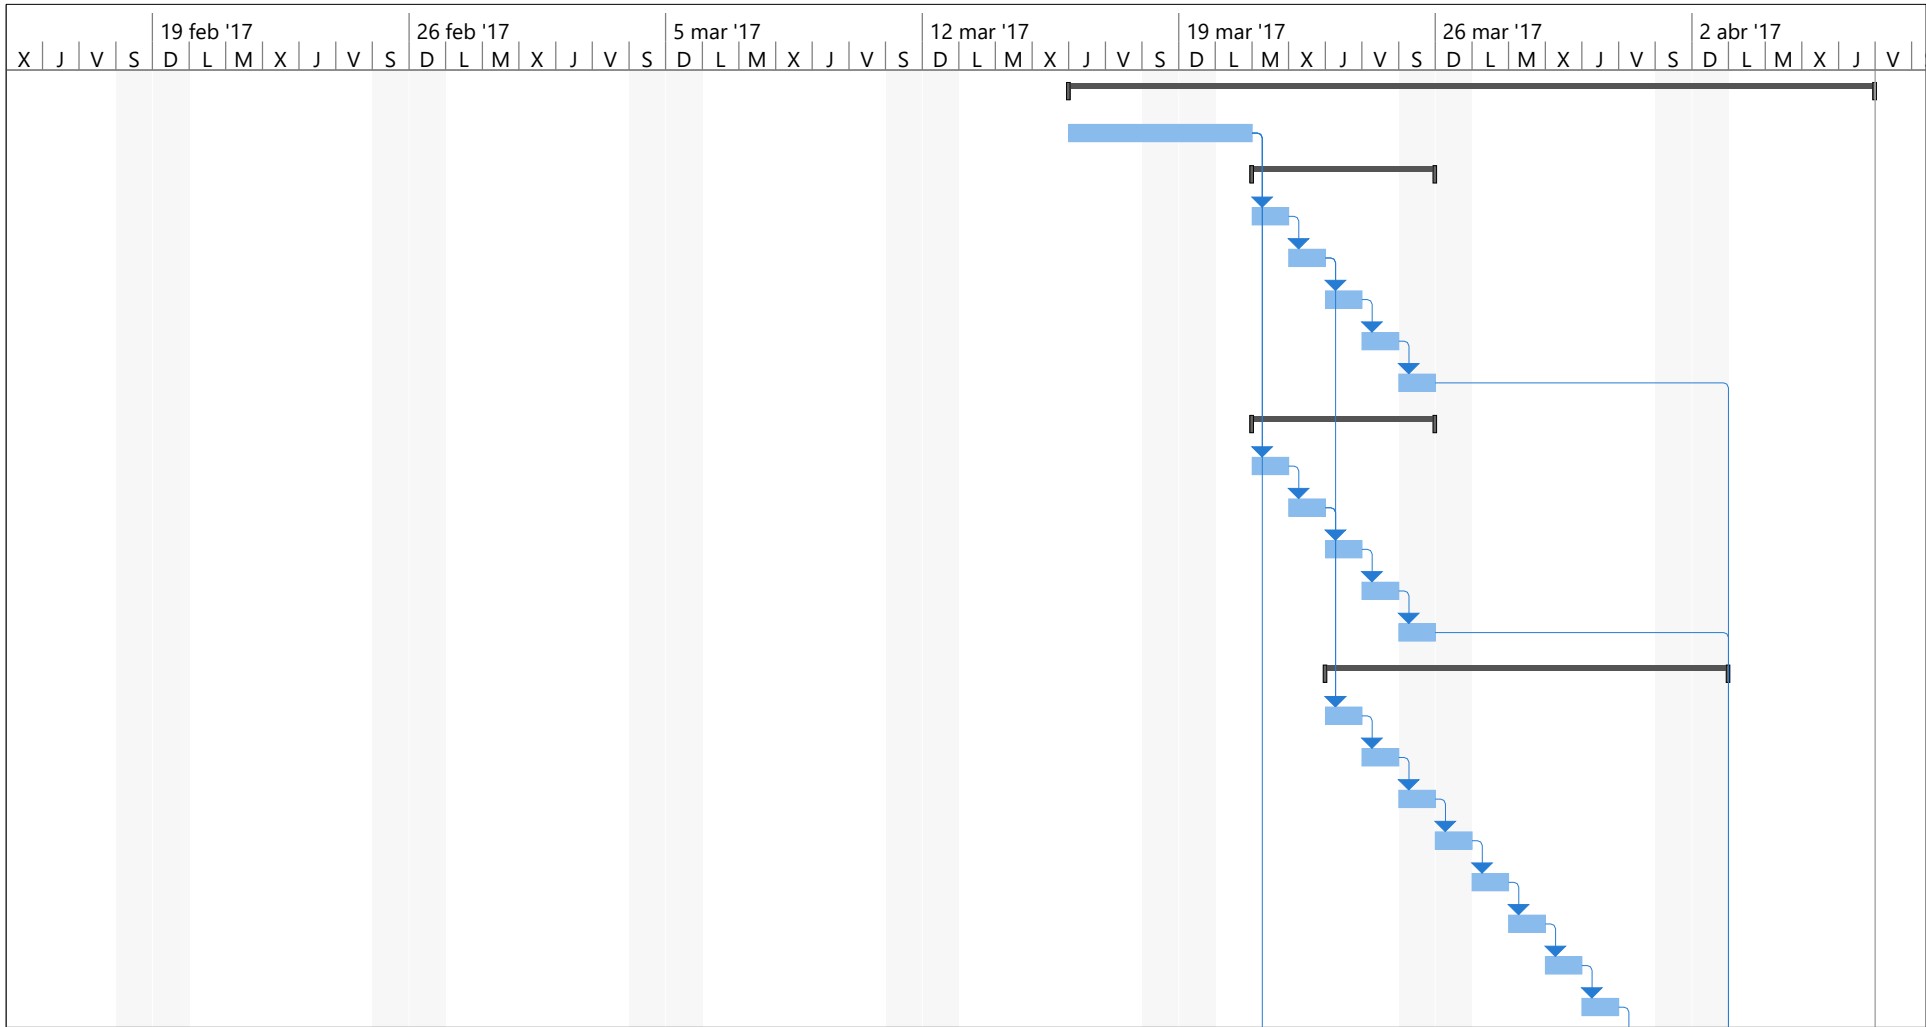

Proyecto: Anexo 2 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

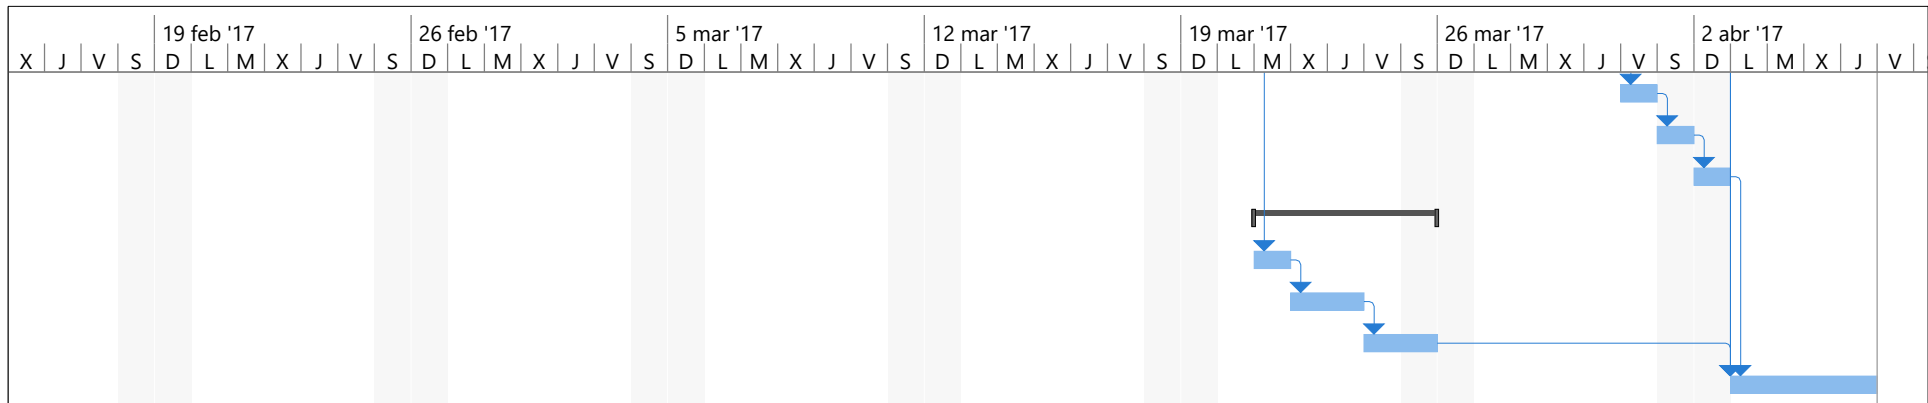

Proyecto: Anexo 2 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				
