























































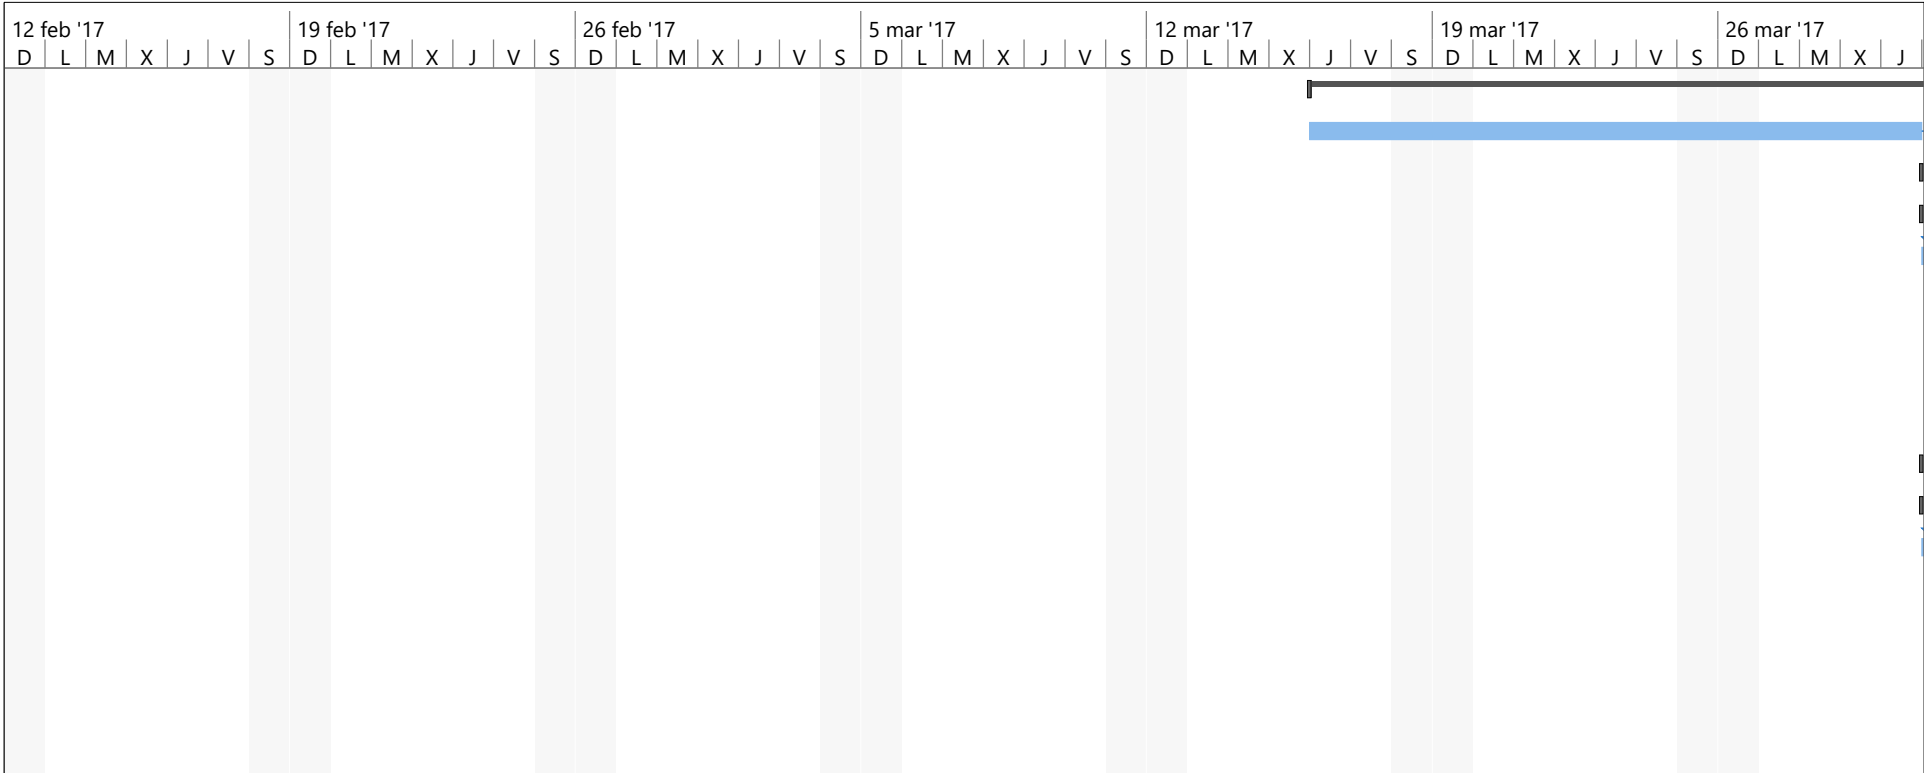


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	6							18 dic '16							25 dic '16					
							M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M					
1			Proyecto Enlace Quibdó - Medio Atrato	105 días	jue 16/03/17	mié 28/06/17																				
2			Logística	15 días	jue 16/03/17	jue 30/03/17																				
3			Torre 1 Quibdó	85 días	vie 31/03/17	vie 23/06/17																				
4			Obra Civil y Torre	60 días	vie 31/03/17	lun 29/05/17																				
5			Cimentación	30 días	vie 31/03/17	sáb 29/04/17																				
6			Torre	20 días	dom 30/04/17	vie 19/05/17																				
7			Cerramiento	10 días	sáb 20/05/17	lun 29/05/17																				
8			Energía	15 días	mar 30/05/17	mar 13/06/17																				
9			Equipos Microondas y Networking	10 días	mié 14/06/17	vie 23/06/17																				
10			Torre 2 Medio Atrato	85 días	vie 31/03/17	vie 23/06/17																				
11			Obra Civil y Torre	60 días	vie 31/03/17	lun 29/05/17																				
12			Cimentación	30 días	vie 31/03/17	sáb 29/04/17																				
13			Torre	20 días	dom 30/04/17	vie 19/05/17																				
14			Cerramiento	10 días	sáb 20/05/17	lun 29/05/17																				
15			Energía	15 días	mar 30/05/17	mar 13/06/17																				
16			Equipos Microondas y Networking	10 días	mié 14/06/17	vie 23/06/17																				
17			Pruebas	5 días	sáb 24/06/17	mié 28/06/17																				

Proyecto: Anexo 3 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Anexo 3 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				




Proyecto: Anexo 3 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

V S 2 abr '17 9 abr '17 16 abr '17 23 abr '17 30 abr '17 7 may '17 14 may '17
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

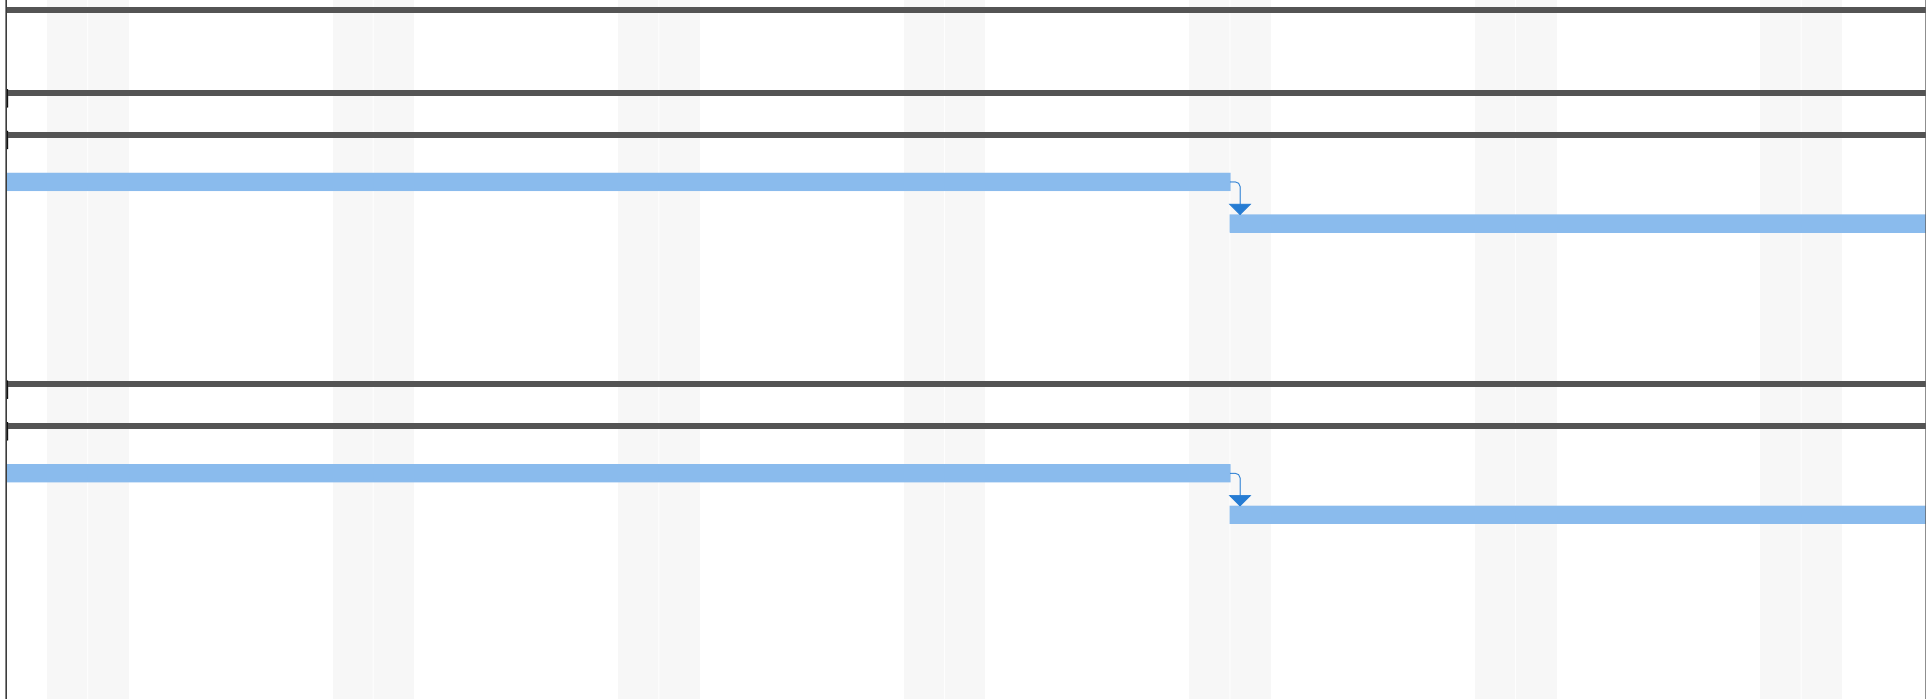

Proyecto: Anexo 3 Cronograma
Fecha: vie 16/12/16

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

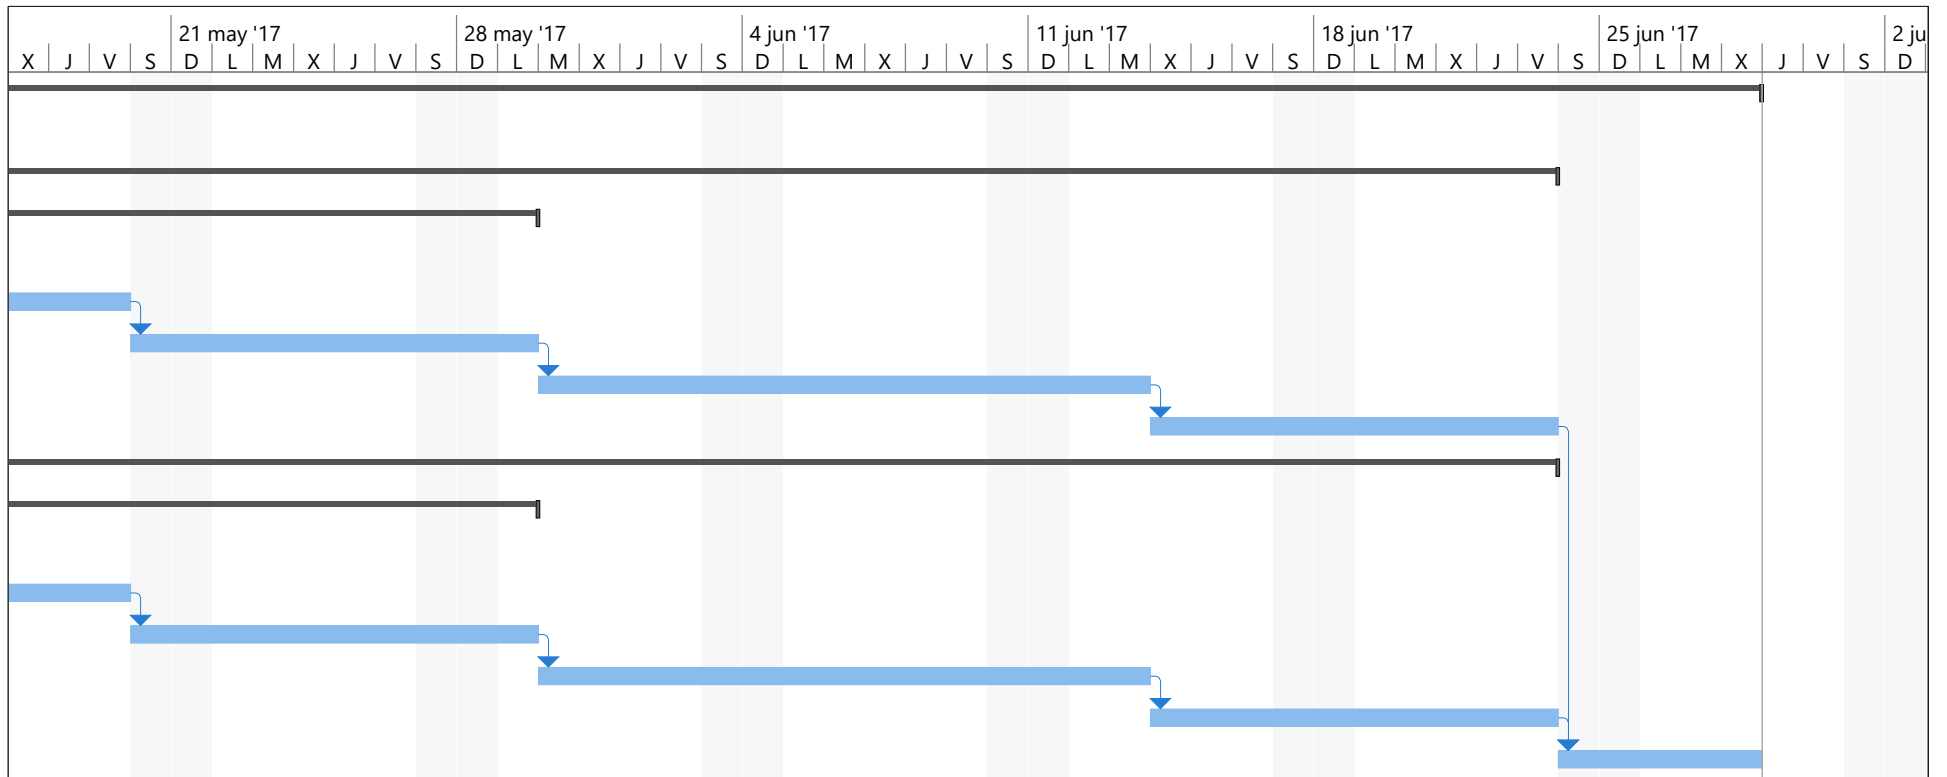

Proyecto: Anexo 3 Cronograma Fecha: vie 16/12/16	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
